



下地補修工事

材料検収

ボンドはくりシールONE

F☆☆☆☆



下地補修工事

材料検収

ボンドはくりシールONE

F☆☆☆☆



下地補修工事

材料検収

ステンレスピン  
SUS304







工事名: 大規模修繕工事  
工 種: 下地補修工事  
材料検収:  
ユニエポ補修用  
プライマー  
F☆☆☆☆

下地補修工事

材料検収

ユニエポ補修用  
プライマー  
F☆☆☆☆



工事名: 大規模修繕工事  
工 種: 下地補修工事  
材料検収:  
Kモルタル  
#41031  
JIS A 6024  
F☆☆☆☆

下地補修工事

材料検収

Kモルタル  
#41031  
F☆☆☆☆  
JIS A 6024



工事名: 大規模修繕工事  
工 種: 下地補修工事  
材料検収:  
Kモルタル  
#41031  
JIS A 6024  
F☆☆☆☆

下地補修工事

材料検収

Kモルタル  
#41031  
F☆☆☆☆  
JIS A 6024



JIS A 6024




100角



F☆☆☆☆



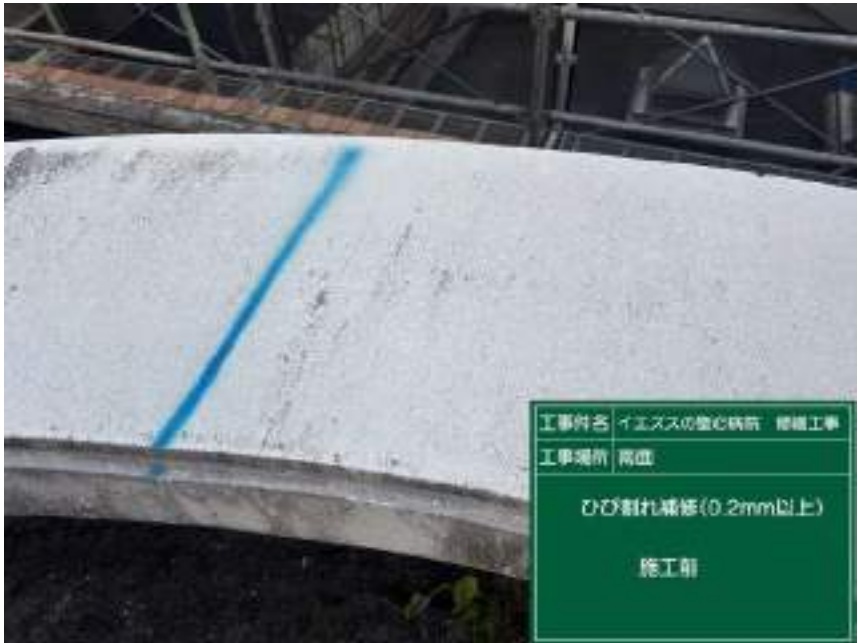

下地補修工事

ひびわれ補修

施工前



下地補修工事

ひびわれ補修

ケレン状況



下地補修工事

ひびわれ補修

座金取付状況



下地補修工事

ひびわれ補修

シール充填状況



下地補修工事

ひびわれ補修

注入状況



下地補修工事

ひびわれ補修

撤去状況





下地補修工事

ひびわれ補修

刷り込み状況



下地補修工事

ひびわれ補修

施工完了



下地補修工事

モルタル浮き

施工前



下地補修工事

モルタル浮き

削孔状況



下地補修工事

モルタル浮き

清掃状況



下地補修工事

モルタル浮き

ステンレスピン注入状況





下地補修工事

モルタル浮き

樹脂注入状況



下地補修工事

モルタル浮き

穴埋め状況



下地補修工事

モルタル浮き

施工完了

黑板誤記

穴埋め状況⇒施工完了



下地補修工事

爆裂補修

施工前



下地補修工事

爆裂補修

研り状況



下地補修工事

爆裂補修

ケレン状況





下地補修工事

爆裂補修

清掃状況



下地補修工事

爆裂補修

防錆材塗布状況



下地補修工事

爆裂補修

プライマー塗布状況



下地補修工事

爆裂補修

埋め戻し状況



下地補修工事

爆裂補修

施工完了



下地補修工事

塗膜浮補修

施工前





下地補修工事

塗膜浮補修

研り状況



下地補修工事

塗膜浮補修

清掃状況



下地補修工事

塗膜浮補修

接着剤塗布状況



下地補修工事

塗膜浮補修

埋め戻し状況



下地補修工事

塗膜浮補修

施工完了





下地補修工事

タイルクラック補修

東面

施工前



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

カッター入れ状況



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

研り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

清掃状況



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

接着剤塗布状況



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

タイル貼り状況





下地補修工事

タイルクラック補修

東面

目地埋め状況



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

ふき取り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

施工完了



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

施工前



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

カッター入れ状況



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

研り状況





下地補修工事

タイルクラック補修

西面

清掃状況



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

接着剤塗布状況



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

タイル貼り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

目地埋め状況



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

ふき取り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

施工完了





下地補修工事

タイルクラック補修

南面

施工前



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

カッター入れ状況



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

研り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

清掃状況



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

接着剤塗布状況



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

タイル貼り状況





下地補修工事

タイルクラック補修

南面

目地埋め状況



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

ふき取り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

施工完了



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

施工前



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

カッター入れ状況



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

研り状況





下地補修工事

タイルクラック補修

北面

清掃状況



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

接着剤塗布状況



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

タイル貼り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

目地埋め状況



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

ふき取り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

施工完了





下地補修工事

タイル浮補修

東面

施工前



下地補修工事

タイル浮補修

東面

削孔状況



下地補修工事

タイル浮補修

東面

清掃状況



下地補修工事

タイル浮補修

東面

ステンレスピン挿入状況



下地補修工事

タイル浮補修

東面

エポキシ樹脂注入状況



下地補修工事

タイル浮補修

東面

目地埋め状況





下地補修工事

タイル浮補修

東面

ふき取り状況



下地補修工事

タイル浮補修

東面

施工完了



下地補修工事

タイル浮補修

西面

施工前



下地補修工事

タイル浮補修

西面

削孔状況



下地補修工事

タイル浮補修

西面

清掃状況



下地補修工事

タイル浮補修

西面

ステンレスピン挿入状況





下地補修工事

タイル浮補修

西面

エポキシ樹脂注入状況



下地補修工事

タイル浮補修

西面

目地埋め状況



下地補修工事

タイル浮補修

西面

ふき取り状況



下地補修工事

タイル浮補修

西面

施工完了



下地補修工事

タイル浮補修

南面

施工前



下地補修工事

タイル浮補修

南面

削孔状況





下地補修工事

タイル浮補修

南面

清掃状況



下地補修工事

タイル浮補修

南面

ステンレスピン挿入状況



下地補修工事

タイル浮補修

南面

エポキシ樹脂注入状況



工事件名	イエズスの聖の病院 修繕工事
工事場所	南面
タイル浮き漏れ	
目地埋め状況	

下地補修工事

タイル浮補修

南面

目地埋め状況



工事件名	イエズスの聖の病院 修繕工事
工事場所	南面
タイル浮き漏れ	
抜き取り状況	

下地補修工事

タイル浮補修

南面

ふき取り状況



工事件名	イエズスの聖の病院 修繕工事
工事場所	南面
タイル浮き漏れ	
完了	

下地補修工事

タイル浮補修

南面

施工完了





下地補修工事

タイル浮補修

北面

施工前



下地補修工事

タイル浮補修

北面

削孔状況



下地補修工事

タイル浮補修

北面

清掃状況



下地補修工事

タイル浮補修

北面

ステンレスピン挿入状況



下地補修工事

タイル浮補修

北面

エポキシ樹脂注入状況



下地補修工事

タイル浮補修

北面

目地埋め状況





工事件名	イエスの壁の病院 修繕工事
工事場所	北面
タイル浮き補修	
拭き取り状況	

下地補修工事

タイル浮補修

北面

ふき取り状況



工事件名	イエスの壁の病院 修繕工事
工事場所	北面
タイル浮き補修	
完了	

下地補修工事

タイル浮補修

北面

施工完了



シーリング 工事

空缶検収

はくりシールONE  
3本



シーリング 工事

空缶検収

E206  
1セット



シーリング 工事

空缶検収

ユニエポ補修用  
プライマー

1缶





シーリング 工事

空缶検収

Kモルタル  
1セット



シーリング 工事

空缶検収

E208  
22セット



防水工事

材料検収

サラセーヌP



防水工事

材料検収

サラセーヌP



防水工事

材料検収

サラセーヌK





防水工事

材料検収

サラセーヌK



防水工事

材料検収

サラセーヌ立上り用



防水工事

材料検収

サラセーヌ立上り用



防水工事

材料検収

サラセーヌA立上り用



防水工事

材料検収

サラセーヌA立上り用



防水工事

材料検収

ジョイントテープ





防水工事

材料検収

ガラセースT



防水工事

材料検収

ガラセースT



防水工事

材料検収

Tシンナー



工事名 | イエスエス製鉄所大規模修繕工事  
工 種 | 防水  
施 工 部 門 | 建築工務部  
使用材料  
Tシンナー  
(10缶)

防水工事

材料検収

Tシンナー



工事名 | イエスエス製鉄所大規模修繕工事  
工 種 | 防水工事  
材料検収  
QVシート

防水工事

材料検収

QVシート



工事名 | イエスエス製鉄所大規模修繕工事  
工 種 | 防水工事  
材料検収  
ジョイントテープ

防水工事

材料検収

ジョイントテープ





防水工事

材料検収


MBテープ100



防水工事

材料検収

脱気筒

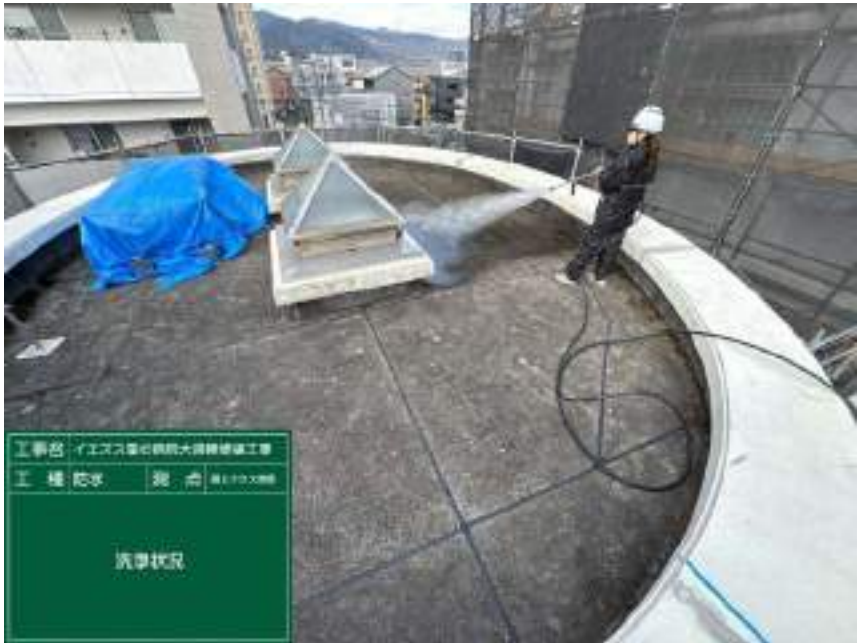


防水工事

高圧洗浄状況



防水工事

高圧洗浄状況

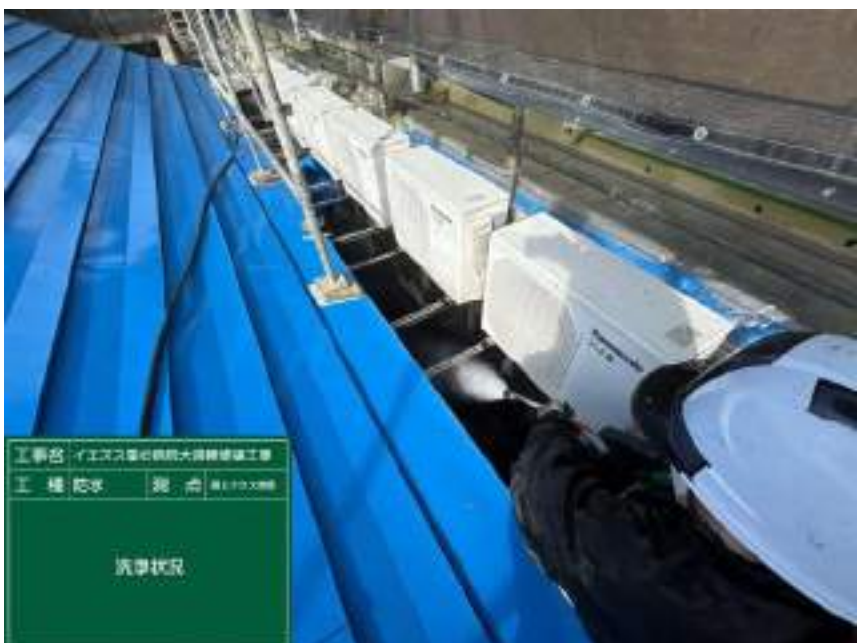

防水工事

高圧洗浄状況





防水工事

高圧洗浄状況




防水工事

高圧洗浄状況



防水工事

高圧洗浄状況

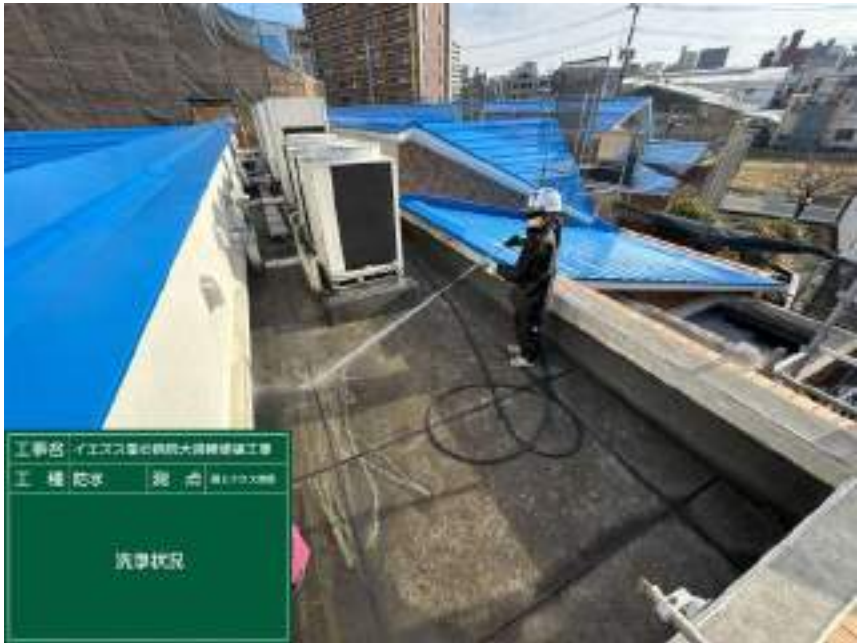

防水工事

高圧洗浄状況



防水工事

チャペル屋上部

施工前



防水工事

チャペル屋上部

施工前





防水工事

チャペル屋上部


施工前



防水工事

チャペル屋上部

施工前

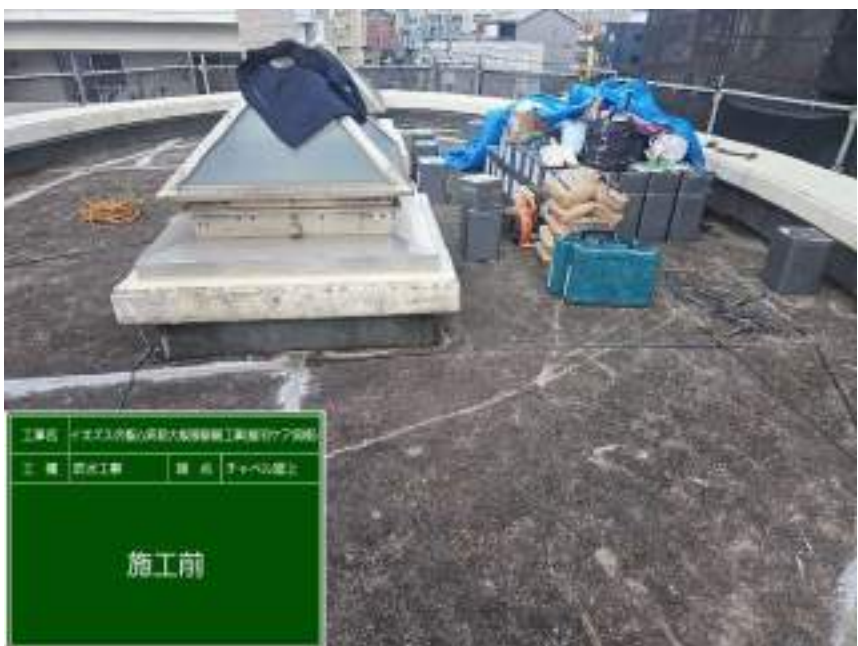

防水工事

チャペル屋上部

施工前



防水工事

チャペル屋上部

既存ドレン撤去状況



防水工事

チャペル屋上部

既存押え金物撤去状況



防水工事

チャペル屋上部

既存防水層撤去状況





防水工事

チャペル屋上部

既存伸縮目地撤去状況



防水工事

チャペル屋上部

既存伸縮目地  
埋め戻し状況



防水工事

チャペル屋上部

ケレン清掃状況



防水工事

チャペル屋上部

ケレン清掃状況



防水工事

チャペル屋上部

ケレン清掃状況



防水工事

チャペル屋上部

ケレン清掃状況





防水工事

チャペル屋上部

ケレン清掃状況



防水工事

チャペル屋上部

ケレン清掃状況



防水工事

チャペル屋上部

下地処理状況



防水工事

チャペル屋上部

下地処理状況



防水工事

チャペル屋上部

下地処理状況



防水工事

チャペル屋上部

プライマー塗布状況





工事名	イオニアのまちづくり推進事業（工務部）		
工種	防水工事	測点	チャペル屋上
プライマー塗布状況			

防水工事

チャペル屋上部

プライマー塗布状況




工事名	イオニアのまちづくり推進事業（工務部）		
工種	防水工事	測点	チャペル屋上
プライマー塗布状況			

防水工事

チャペル屋上部

プライマー塗布状況

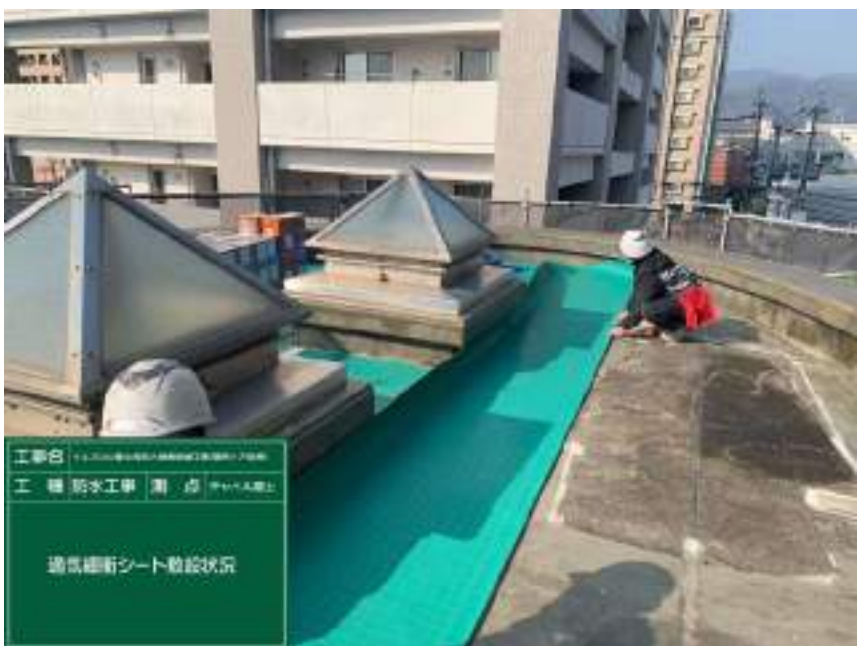

工事名	イオニアのまちづくり推進事業（工務部）		
工種	防水工事	測点	チャペル屋上
通気緩衝シート敷設状況			

防水工事

チャペル屋上部

通気緩衝シート敷設状況



工事名 千葉県庁庁舎の屋根防水工事  
工 種 防水工事 測 点 チャペル屋上  
シート転圧状況

防水工事

チャペル屋上部

シート転圧  
状況




工事名 千葉県庁庁舎の屋根防水工事  
工 種 防水工事 測 点 チャペル屋上  
ジョイントテープ貼り状況

防水工事

チャペル屋上部

ジョイントテープ貼り  
状況

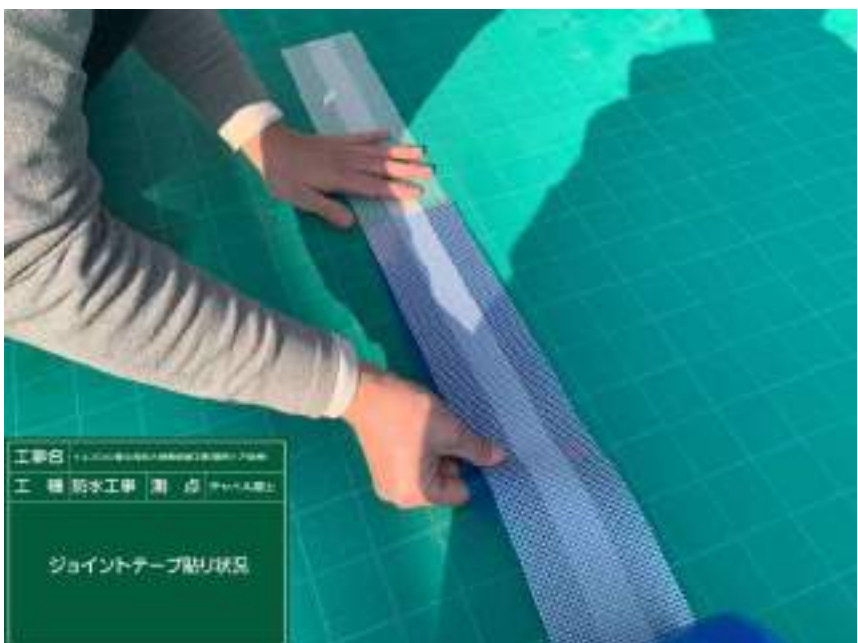

工事名 千葉県庁庁舎の屋根防水工事  
工 種 防水工事 測 点 チャペル屋上  
ジョイントテープ貼り状況

防水工事

チャペル屋上部

ジョイントテープ貼り  
状況






防水工事

チャペル屋上部

端末テープ貼り  
状況

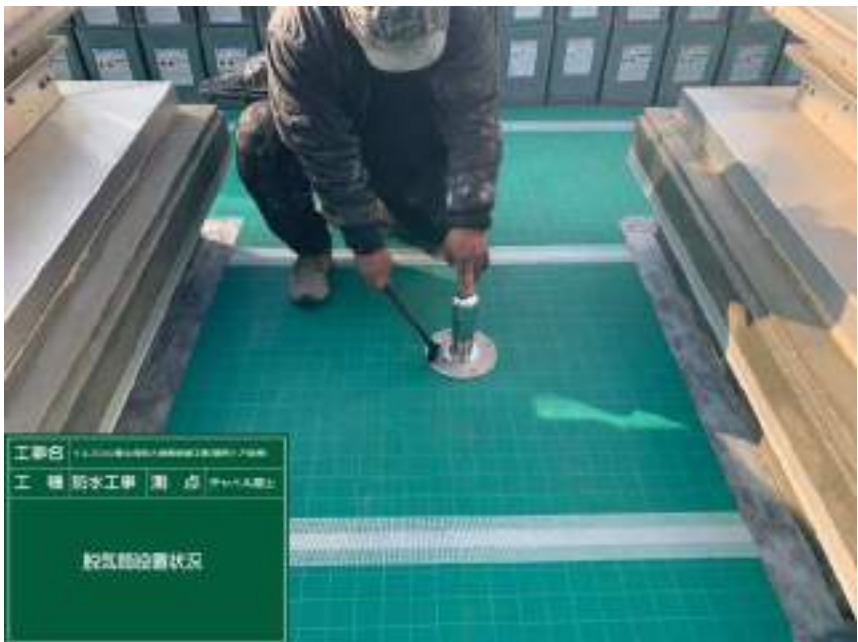

防水工事

チャペル屋上部

脱気筒取付状況



防水工事

チャペル屋上部

水切りテープ貼り状況



防水工事

チャペル屋上部

水切りテープ貼り状況



防水工事

チャペル屋上部

ウレタン1層目状況



防水工事

チャペル屋上部

ウレタン1層目状況





防水工事

チャペル屋上部

ウレタン2層目状況



防水工事

チャペル屋上部

ウレタン2層目状況



防水工事

チャペル屋上部

トップコート塗布状況



## 防水工事

チャペル屋上部

トップコート塗布状況



## 防水工事

チャペル屋上部

施工完了



## 防水工事

チャペル屋上部

施工完了






防水工事

チャペル屋上部

施工完了

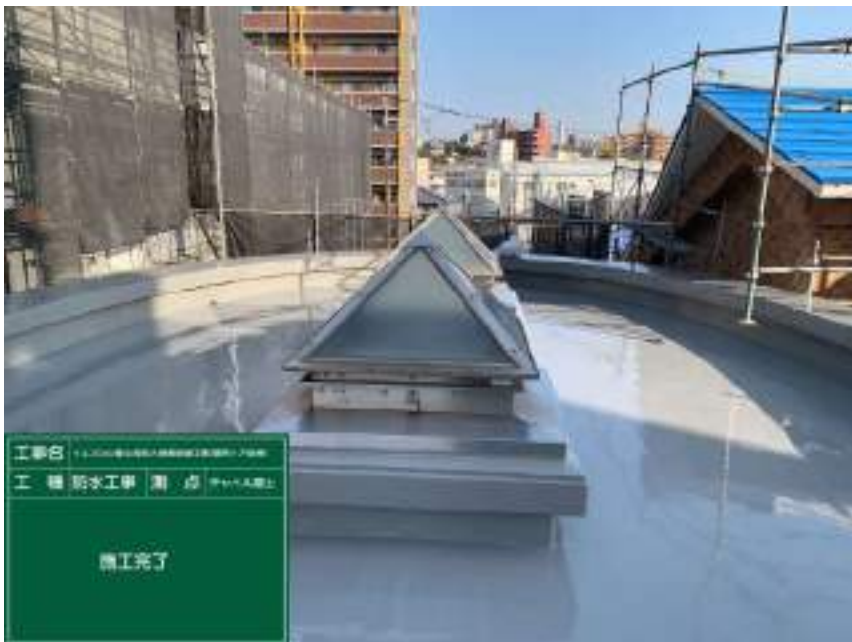

防水工事

チャペル屋上部

施工完了



防水工事

チャペル屋上部

施工完了



防水工事

屋上テラス

施工前



防水工事

屋上テラス

施工前




防水工事

屋上テラス

施工前



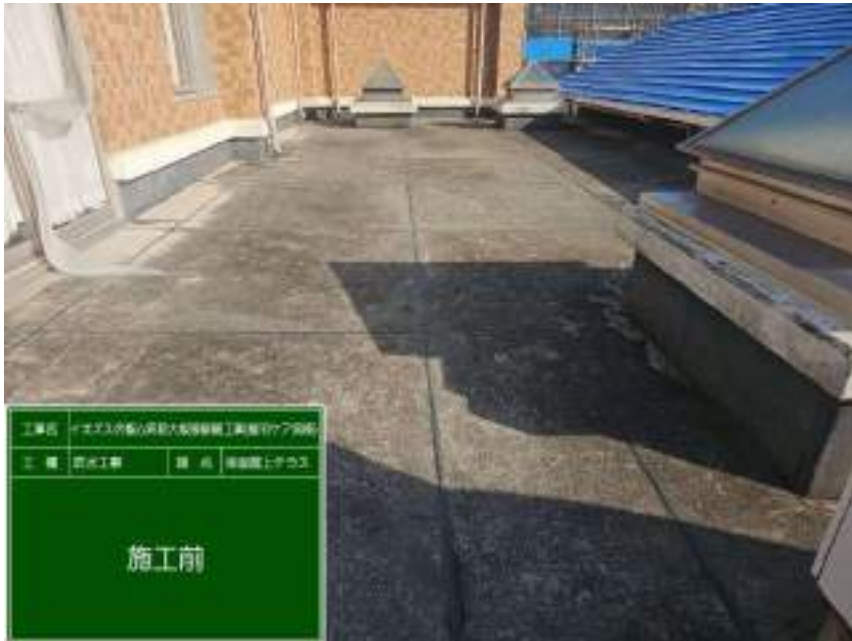

防水工事

屋上テラス

施工前



防水工事

屋上テラス

施工前



防水工事

屋上テラス

施工前



防水工事

屋上テラス

施工前



防水工事

屋上テラス

施工前



防水工事

屋上テラス

既存ドレン撤去状況





防水工事

屋上テラス

既存押え金物撤去状況



防水工事

屋上テラス

既存押え金物撤去状況



防水工事

屋上テラス

既存防水層撤去状況







防水工事

屋上テラス

ケレン清掃状況



防水工事

屋上テラス

ケレン清掃状況



防水工事

屋上テラス

伸縮目地埋め戻し状況



防水工事

屋上テラス

伸縮目地埋め戻し状況



防水工事

屋上テラス

下地処理状況



防水工事

屋上テラス

下地処理状況





防水工事

屋上テラス

プライマー塗布状況



防水工事

屋上テラス

プライマー塗布状況



防水工事

屋上テラス

通気緩衝シート貼り状況



防水工事

屋上テラス

シート転圧状況



防水工事

屋上テラス

端末テープ貼り状況



防水工事

屋上テラス

ジョイントテープ貼り  
状況





防水工事

屋上テラス

脱気筒取付状況



防水工事

屋上テラス

ウレタン1層目状況



防水工事

屋上テラス

ウレタン1層目状況



防水工事

屋上テラス

ウレタン2層目状況



防水工事

屋上テラス

ウレタン2層目状況



防水工事

屋上テラス

トップコート状況





防水工事

屋上テラス

トップコート状況



防水工事

屋上テラス

施工完了



防水工事

屋上テラス

施工完了



工事名 千葉県市川市にあるマンションの防水工事後の様子  
工 種 防水工事 測 点 東側壁と平天井  
施工完了

防水工事

屋上テラス

施工完了



工事名 千葉県市川市にあるマンションの防水工事後の様子  
工 種 防水工事 測 点 東側壁と平天井  
施工完了

防水工事

屋上テラス

施工完了



工事名 千葉県市川市にあるマンションの防水工事後の様子  
工 種 防水工事 測 点 東側壁と平天井  
施工完了

防水工事

屋上テラス

施工完了













防水工事

空缶検収

サラセーヌT

5セット



防水工事

空缶検収

サラセーヌT

4セット

計9セット



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

東面①

施工前



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

東面①

撤去状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

東面①

清掃状況





シーリング 工事

タイル目地打ち換え

東面①

プライマー塗布状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

東面①

シール充填状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

東面①

ヘラ押え状況



## シーリング 工事

## タイル目地打ち換え

東面①

施工完了



## シーリング 工事

## タイル目地打ち換え

## 東面②

施工前



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

東面②

撤去状況





シーリング 工事

タイル目地打ち換え

東面②

清掃状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

東面②

プライマー塗布状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

東面②

シール充填状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

東面②

へら押し状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

東面②

施工完了



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

西面①

施工前





シーリング 工事

タイル目地打ち換え

西面①

撤去状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

西面①

清掃状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

西面①

プライマー塗布状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

西面①

シーリング充填状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

西面①

ヘラ押し状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

西面①

施工完了





シーリング 工事

タイル目地打ち換え

西面②

施工前



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

西面②

撤去状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

西面②

清掃状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

西面②

プライマー塗布状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

西面②

シール充填状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

西面②

ヘラ押え状況





シーリング 工事

タイル目地打ち換え

西面②

施工完了



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

南面①

施工前



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

南面①

撤去状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

南面①

清掃状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

南面①

プライマー塗布状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

南面①

シール充填状況





シーリング 工事

タイル目地打ち換え

南面①

ヘラ押え状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

南面①

施工完了



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

南面②

施工前



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

南面②

撤去状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

南面②

清掃状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

南面②

プライマー塗布状況





シーリング 工事

タイル目地打ち換え

南面②

シーリング充填状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

南面②

ヘラ押し状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

南面②

施工完了



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

北面①

撤去状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

北面①

清掃状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

北面①

プライマー塗布状況





シーリング 工事

タイル目地打ち換え

北面①

シーリング充填状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

北面①

ヘラ押し状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

北面①

施工完了



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

北面②

施工前



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

北面②

撤去状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

北面②

清掃状況





シーリング 工事

タイル目地打ち換え

北面②

プライマー塗布状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

北面②

シール充填状況



シーリング 工事

タイル目地打ち換え

北面②

ヘラ押え状況



シーリング工事

## タイル目地打ち換え

北面②

施工完了



## シーリング 工事

## サッシ廻りシール 打ち換え

東面①

施工前



シーリング工事

サッシ廻りシール  
打ち換え

東面①

撤去狀況





シーリング 工事

サッシ廻りシール  
打ち換え

東面①

清掃状況



シーリング 工事

建具廻りシール打ち換え

東面①

プライマー塗布状況



シーリング 工事

建具廻りシール打ち換え

東面①

シール充填状況



シーリング 工事

建具廻りシール打ち換え

東面①

施工完了



シーリング 工事

建具廻りシール打ち換え

東面②

施工前



シーリング 工事

建具廻りシール打ち換え

東面②

撤去状況





シーリング 工事

建具廻りシーリング打ち換え

東面②

清掃状況



シーリング 工事

建具廻りシーリング打ち換え

東面②

プライマー塗布状況



シーリング 工事

建具廻りシーリング打ち換え

東面②

シーリング充填状況



シーリング 工事

建具廻りシール打ち換え

東面②

へら押え状況



シーリング 工事

建具廻りシール打ち換え

東面②

施工完了



シーリング 工事

建具廻りシール打ち換え

西面①

施工前





シーリング 工事

建具廻りシール打ち換え

西面①

撤去状況



シーリング 工事

建具廻りシール打ち換え

西面①

清掃状況



シーリング 工事

建具廻りシール打ち換え

西面①

プライマー塗布状況



シーリング 工事

建具廻りシール打ち換え

西面①

シール充填状況



シーリング 工事

建具廻りシール打ち換え

西面①

ヘラ押え状況



シーリング 工事

建具廻りシール打ち換え

西面①

施工完了





シーリング 工事

## 建具廻りシール打ち換え

西面②

施工前



## シーリング 工事

## 建具廻りシール打ち換え

西面②

撤去狀況



シーリング 工事

## 建具廻りシール打ち換え

西面②

清掃状況

